

## 浜岡原子力発電所1、2号機 共用排気筒筒身の切断開始時期について


2021年3月10日

当社は、1,2号機共用排気筒筒身の切断作業を2021年度当初から開始する計画(2020年1月9日お知らせ済)としていましたが、同排気筒内面のモルタル撤去に時間を要するため、筒身切断開始時期を2021年9月頃へ見直すことから、お知らせいたします。

今後も安全確保を最優先に着実に進めてまいります。

### 【経緯】

- ・2018年11月19日 1,2号機共用排気筒の解体撤去作業を開始。
- ・2020年1月9日 解体撤去作業のうち、第2ステップ(下図参照)にあたる排気筒内面のモルタル撤去作業に着手。
- ・モルタル撤去作業の進捗により、モルタル内部に排気筒建設時に使用した仮設部材(以下、「仮設部材」という。)が多数残存していることを確認。
- ・モルタル撤去作業の支障となる仮設部材の撤去作業を追加したため、モルタル撤去完了までの工期が延長した。
- ・その結果、筒身切断開始時期を2021年9月頃へ見直した。

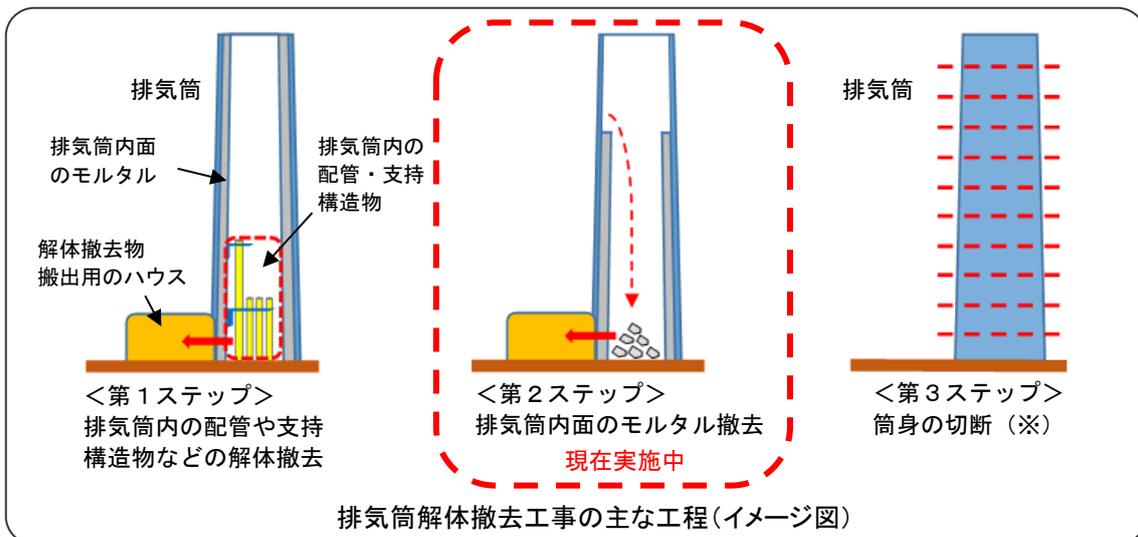

※切断した筒身(鋼板)は、「放射性廃棄物でない廃棄物」であり、有価品や産業廃棄物として発電所から搬出する計画です。

工事内容	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
排気筒内の配管等の解体撤去				
排気筒内面のモルタル撤去		▼着手		
筒身の切断				▽着手

工事概要工程

<これまでのお知らせ内容>

- 浜岡原子力発電所 1, 2 号機 廃止措置の第 2 段階への移行について  
([2016 年 2 月 3 日お知らせ済](#))
- 浜岡原子力発電所 1, 2 号機 共用排気筒の解体撤去に向けた工事の開始について  
([2017 年 10 月 23 日お知らせ済](#))
- 浜岡原子力発電所 1, 2 号機の排気経路の切り替え完了について  
([2018 年 2 月 20 日お知らせ済](#))
- 浜岡原子力発電所 1, 2 号機 共用排気筒の解体撤去工事の開始について  
([2018 年 11 月 19 日お知らせ済](#))
- 浜岡原子力発電所 1, 2 号機 共用排気筒の解体撤去工事のうち排気筒内面モルタル撤去作業の開始について  
([2020 年 1 月 9 日お知らせ済](#))

以 上
