


防波壁本体工事の概要および設置工事スケジュール

1. 防波壁本体工事の概要

本体準備工事が完了した区画から、基礎工事・壁工事等の本体工事を実施します。

本体工事項目	工事の概要
基礎工事	基礎部を設置する工事。 地上から岩盤中まで長方形の穴を掘削し、かご状に組んだ鉄筋を穴の中に入れた後、コンクリートを投入して基礎部を構築する。
壁工事（床版）	壁部の床版部分を設置する工事。 基礎部の上部に鋼材および鉄骨・鉄筋を組み立てた後、コンクリートを投入して床版部分を構築する。
壁工事（たて壁）	壁部のたて壁部分を設置する工事。 床版の上部に鋼殻（鋼板を箱形状にしたもの）を立ち上げ、コンクリートを投入してたて壁を構築する。

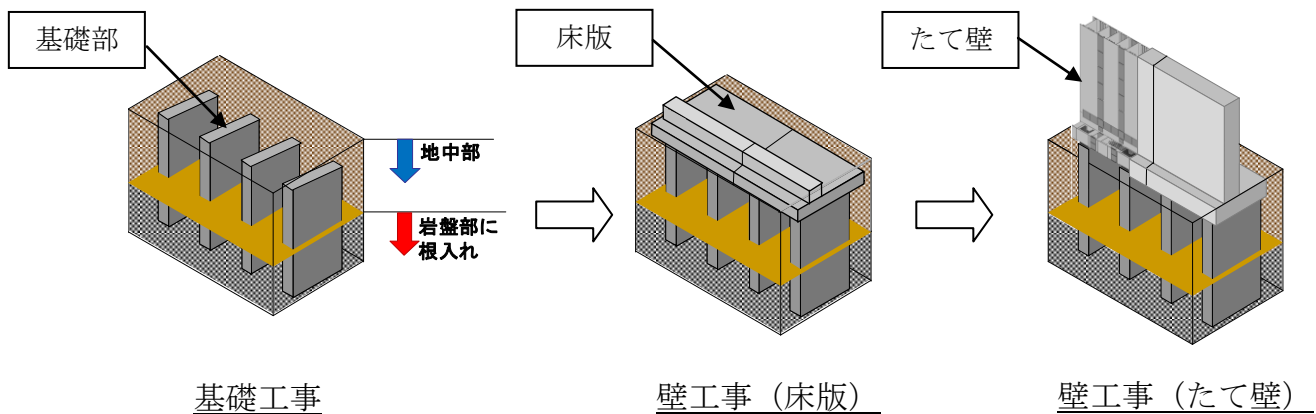

2. 防波壁の設置工事スケジュール

		2011年度				2012年度			
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	
調査・準備工事		▼4月5日着手(地盤調査・測量・干渉物移設工事等)							
本体準備工事		▼9月22日着手(鋼矢板打設・支障物撤去・地盤改良工事等)							
本体工事	基礎工事	▼11月11日着手							
	壁工事（床版）								
	壁工事（たて壁）								
