
浜岡原子力発電所1,2号機 廃止措置状況 (平成21年度 第3四半期 自平成21年11月18日 至平成21年12月31日)

1 第1段階「解体工事準備期間」の進捗状況について

1,2号機の廃止措置の第1段階「解体工事準備期間」では、燃料搬出、汚染状況の調査・検討、系統除染および放射線 管理区域外の設備・機器の解体撤去を実施しています。

第1段階「解体工事準備期間」の進捗状況※1

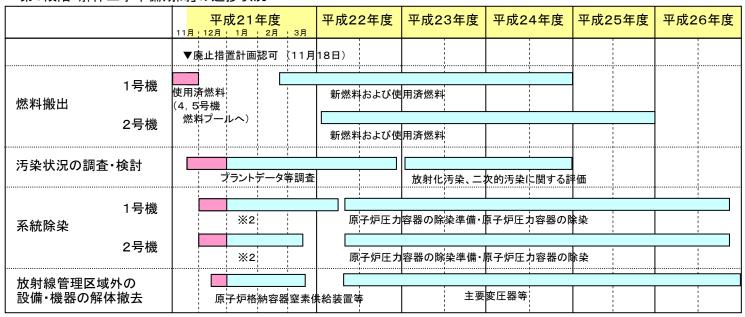

- ※1 本計画については、工事の実施状況、検討・評価状況等により変更となる可能性があります
- ※2 原子炉再循環系、原子炉冷却材浄化系および余熱除去系の除染

【特記事項】

- •廃止措置計画認可:平成21年11月18日
- ·施設定期検査申請: 平成 21 年 12 月 18 日

2 燃料搬出の状況について(単位:体)

(平成21年12月31日現在)

分類	保管場所	項目	1号機	2号機	備考
	燃料プール	貯蔵数(当初)※1	206	1,164	
使用済		搬出数(前四半期末まで)*2	110	0	
燃料		搬出数(今四半期中)※3	27	0	
		貯蔵数(今四半期末)	69	1,164	
	燃料プール	貯蔵数(当初) ^{※1}	0	148	
		搬出数(前四半期末まで)*2	0	0	
		搬出数(今四半期中)※3	0	0	
立亡 附件 小小		貯蔵数(今四半期末)	0	148	
新燃料		貯蔵数(当初) ^{※1}	96	52	
	新燃料 貯蔵庫	搬出数(前四半期末まで)※2	0	0	
		搬出数(今四半期中)※3	0	0	
		貯蔵数(今四半期末)	96	52	

- ※1 廃止措置計画認可申請書に記載した、平成21年4月1日時点の保管場所毎の数量。
- ※2 平成 21 年 4 月 1 日より廃止措置計画認可日前である平成 21 年 11 月 17 日までの搬出数。
- ※3 廃止措置計画認可日である平成 21 年 11 月 18 日以降平成 21 年 12 月 31 日までの搬出数。

3 系統除染の状況について

_	214430143421444)()))	<u> </u>						
	施設の名称	工事件名	目的(工事の概要)	作業期間	実績等				
	浜岡 1、2 号 機格納容器 内配管	浜岡 1,2 号機 格納容器内配 管除染工事	【目的】 格納容器内で長時間滞在する 必要のある汚染状況調査を行 う放射線業務従事者の被ばく 低減対策。 【工事の概要】 ・化学除染 配管内面に付着した放射性物質(放射能を帯びた鉄錆等)を 化学的に除去。 ・機械除染 弁内面に付着した放射性物質 (放射能を帯びた鉄錆等)を物理的に除去。	<1号機 平12月3日 21日 7月16日 号成2日 7月16日 号成11平 11平日 3月19日 3月19日	<1号機> ・平成21年12月3日に取合弁の機械除染着手。 ・平成22年4月に配管(原子炉再循環系、原子炉冷却材浄化系、余熱除去系)の化学除染着手予定。 <2号機> ・平成21年11月30日に取合弁の機械除染着手。 ・平成21年12月18日に余熱除去系配管の化学除染着手。 ・平成21年12月22日に余熱除去系配管の化学除染着手。 ・平成21年12月22日に余熱除去系配管の化学除染着手。 ・平成21年12月22日に余熱除去系配管の化学除染着手。				

4 放射線管理区域外の設備・機器の解体撤去の状況について

(1)解体撤去工事の状況

(1) 肝体派五工				
施設の名称	工事件名	目的(工事の概要)	作業期間	実績等
浜岡 1、2 号 機屋外不活 性ガス系	1,2 号機 不活性 ガス 系 解 体 撤 去工事	【目的】 供用を終了した放射線管 理区域外の設備・機器について順次解体撤去。 【工事の概要】 不活性ガス系のタンク、配管、弁類等を解体中。	<1号機> 平成218日 ~平成22年 3月19日 <2号機 > 平成21年 12月18日 ~平成22 3月19日	<1 号機> ・平成 21 年 12 月 18 日着手。フェンス類を解体中。 <2 号機> ・平成 21 年 12 月 18 日着手。フェンス類を解体中。

(2)放射線管理区域外の解体撤去物(放射性廃棄物ではない廃棄物)の発生・処分状況 (単位:トン)

(平成21年12月31日現在)

	1号機						2号機						
	発生	E量		処え	:分量		発生量		処分量				備考
	今期	累計	今期 累計		今期 累	累計	今	今期		累計			
	フ州	米司	構外※1	構内※2	構外※1	構内※2	マカ	糸司	構外※1	構内※2	構外※1	構内※2	
金属類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
コンクリート類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	·

- ※1:発電所敷地外に産業廃棄物・有価物等として搬出した量。
- ※2:発電所敷地内において再利用した量。

5 今後の予定

●施設定期検査について

施設定期検査は、以下の年月日よりそれぞれ約4ヶ月の期間で受検。

- 1号:平成22年1月25日
- 2号:平成22年1月27日
