


浜岡原子力発電所 3 号機 計装用圧縮空気系配管の減肉

2026 年 9 月 10 日

発生号機	浜岡原子力発電所 3 号機 原子炉建屋地下 1 階（放射線管理区域外）
発生年月日	2026 年 9 月 10 日
状況	浜岡原子力発電所 3 号機原子炉建屋地下 1 階にある計装用圧縮空気系(注 1)配管の肉厚測定を実施した結果、技術基準(注 2)で必要とする肉厚 3.8mm を下回っている箇所が 1 箇所(最小肉厚:2.7mm)あることを本日確認しました。 当該配管からの空気の漏えいはありません。また、当該配管は使用しないよう措置を講じているところです。 今後、原因調査を適切に行うとともに、当該配管の取替を実施してまいります。
放射能の影響	本事象は、放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。

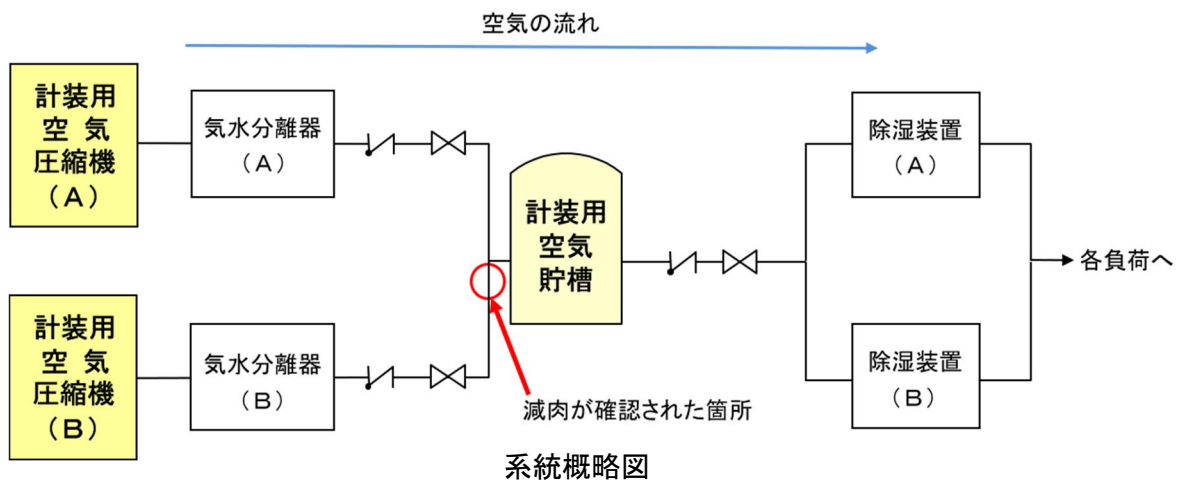

注 1 計器や制御機器を動かすための圧縮空気を供給する系統。

注 2 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」に定められる基準。

以 上
